



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 035

Stavební akce:	"Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa" č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370
----------------	--

Dotčená část stavby:	SO305 Přeložka vodovodu v km 4,540		
Název / označení změny:	sondy napojovací body vodovod		
Podklad pro změnu:	Skutečný stav na stavbě		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	15.07.2024
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Na základě dostupných podkladů z PDPS, byla pro potřeby přeložky vodovodu geodeticky vytyčena poloha napojovacích bodů. Stávající vodovod nebyl v napojovacích bodech a ani v jejich blízkém okolí nalezen. Bylo provedeno místní šetření se správcem vodovodu, ze kterého vyplynulo, že dostupný zakres vodovodu v dokladové části PDPS neodpovídá skutečnosti a není možnost ho vytyčit. Na základě této skutečnosti byla prováděna hloubková sondáž pro zjištění skutečného uložení vodovodu, která trvala po dobu 12 dnů, než byl vodovod nalezen. Po geodetické zaměření byly jámy zasypány a zhutněny.			
<b>Změna se týká položek:</b> viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			295 650,00 Kč
přípočty celkem:			295 650,00 Kč
odpočty celkem:			- Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje JC situace rozsahu situace zakresu vodovodu v PDPS SD obrázková příloha obrázková příloha ÚRS stanovisko AD stanovisko TDS		
firma	Jméno		
zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.			
projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.			
objednatel /SÚSPK/			
TDS DOZOR inženýring s.r.o.			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa  
Objekt: ZL35 - Sondy vodovod SO 305  
Soupis: **SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540**

Místo: Rokycansko  
Zadavatel:  
Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024  
Projektant:   
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>295 650,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		295 650,00
1 - Zemní práce		295 650,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa  
Objekt: ZL35 - Sondy vodovod SO 305  
Soupis: **SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540**

Místo: Rokycansko

Zadavatel:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 23. 5. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


295 650,00

D HSV Práce a dodávky HSV295 650,00

D 1 Zemní práce295 650,00

1	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	810,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151103</a>					
VV			Položka dle ÚRS 2024 01					
			(49,5*2)		99			
			(36,75*2)*2		147			
			(47*2)*6		564			
VV			99+147+564		810,000			
VV			Součet		810,000			
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	810,000			CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101</a>					
VV			Položka dle ÚRS 2024 01					
VV			810		810,000			
VV			Součet		810,000			


<b>EGYPROJEKT</b> <small>SPRÁVA A ÚDRŽBA</small>		Místo : <b>Rokycanska</b>	Investor : <b>Správa a údržba silnic Píseňského kraje p.o.</b>
Projektová a inženýrská činnost Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství ICO : 63 50 96 87 Janačkova ul. č.67, 323 23 Píseň Provodovna : Částkova 74, Píseň Tel. : e-mail : <b>[redacted]</b>		Zpracoval : Zodp.proj. : Hl.ing.proj. :	<b>[redacted]</b>
Objekt : <b>SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540</b>		Datum : <b>05/2019</b>	
Příloha : <b>Situace objektu</b>		Č.zak. : <b>1418</b>	Stupeň : <b>PDPS</b>
Akce :		Příloha : <b>2.</b>	

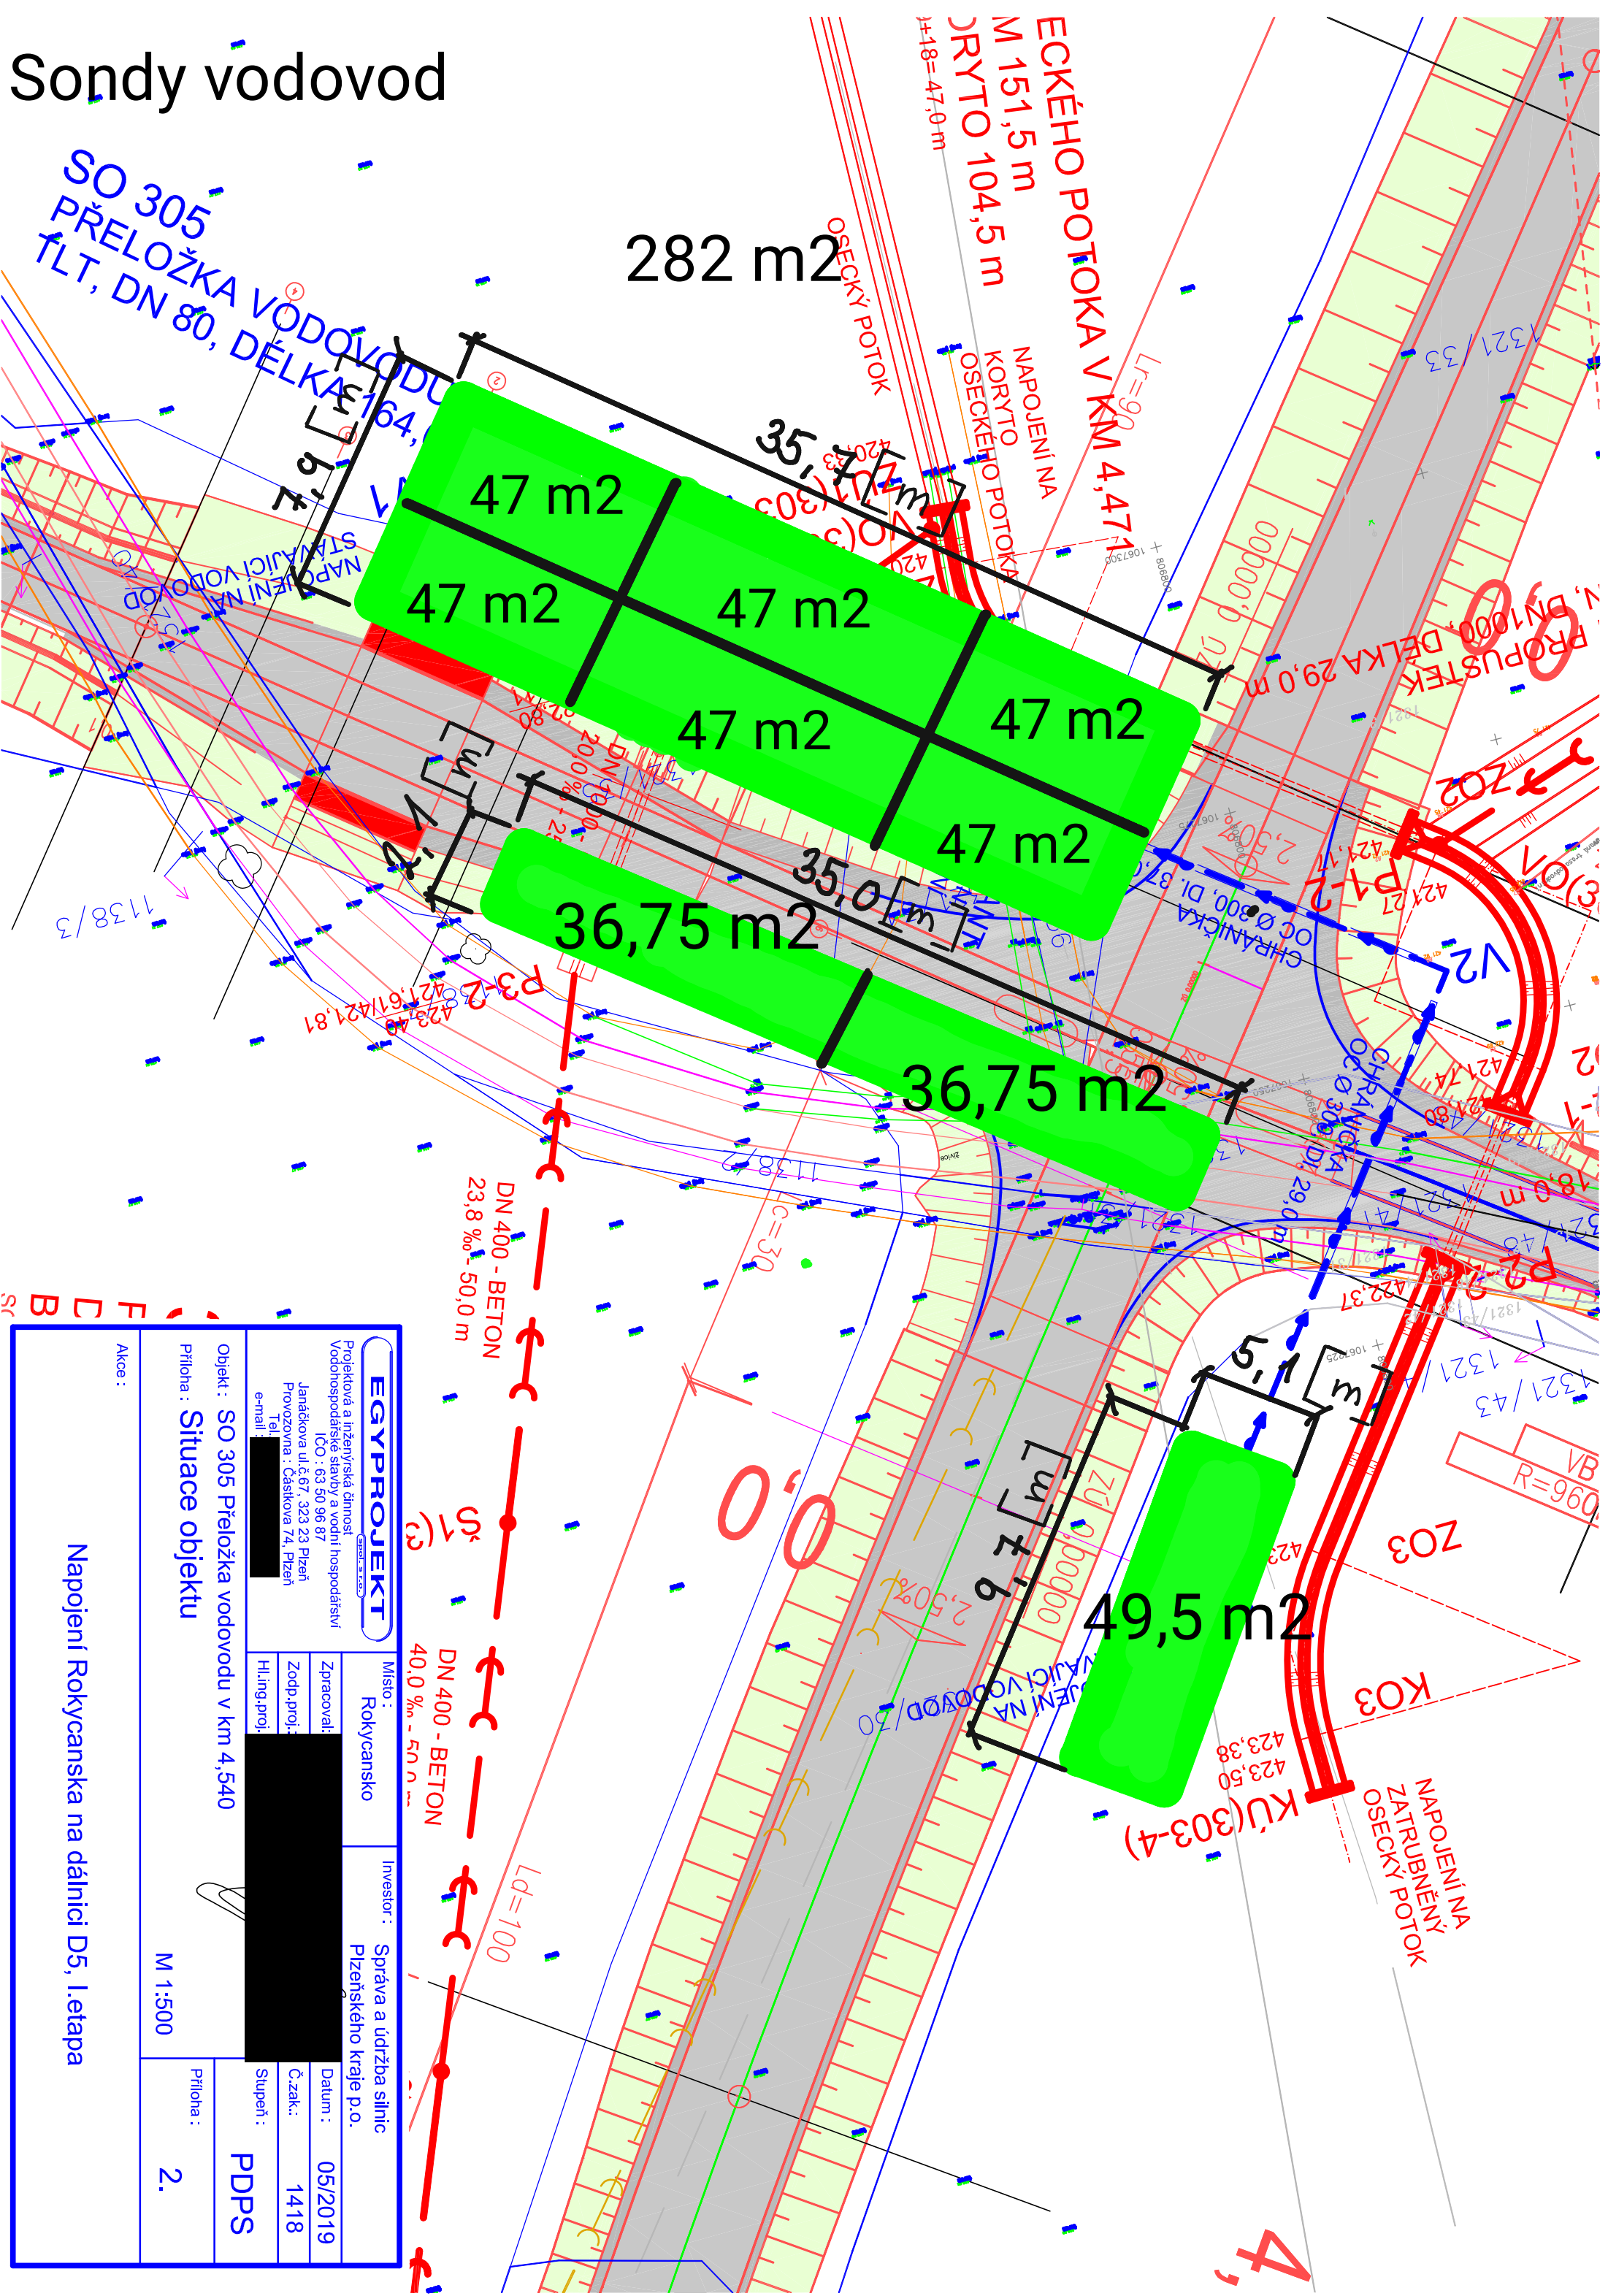



# SO305 - zákres vodovodu v dokladové části PDPS









cesty jsou pro nás cílem

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA




DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540



POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Déšt	1,5°C	0,2 mm/h	1,3 m/s	1°	91%
12:00	 Zamračeno	4,3°C	0,0 mm/h	4,1 m/s	26°	61%
18:00	 Zamračeno	3,4°C	0,0 mm/h	3,9 m/s	54°	67%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové Komatsu 138	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540 - zpětný zásyp provedených sond a hutnění po vrstvách - provedeno nad rámec PD			

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI  
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR [REDACTED] (Stavbyvedoucí)

NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Vedením stavebního deníku v elektronické formě pověřuji stavbyvedoucího p. [REDACTED].

PŘÍLOHY

OSEK - SO 305 - OS...10-  
05.pdf

AUTOR [REDACTED] (Stavbyvedoucí - manažer projektu)

NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis [REDACTED] (Stavbyvedoucí), ze dne 5.10.2023:

Souhlasím s vedením elektronického stavebního deníku.

PŘÍLOHY

OSEK - SO 305 - OS...10-  
05.pdf

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	3,4°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	59°	97%
12:00	Zamračeno	7,4°C	0,0 mm/h	2,0 m/s	211°	86%
18:00	Zamračeno	8,2°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	73°	83%

## OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové Komatsu 138	BIGGEST s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540 - prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení	BIGGEST s.r.o.		

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dle výchozí PD není možné dohledat stávající vodovod SO 305 v km 4,540. Budou prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení stávajícího vodovodu nutného k přeložení. Tyto práce jsou prováděny nad rámec PD.

PŘÍLOHY

OSEK - SO 305 - OS...02-  
16.pdf

Podpisy:





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA



DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANŠKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Zamračeno	0,2°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	201°	93%
12:00	Zamračeno	8,2°C	0,0 mm/h	5,1 m/s	227°	69%
18:00	Zamračeno	7,4°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	205°	78%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Hlavní Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
	Stavbyvedoucí	1	8				

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové Komatsu 138	BIGGEST s.r.o.		1	8


## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540	BIGGEST s.r.o.		
- prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení			
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD, TePř. a KZP			

Podpisy:











cesty jsou pro nás cílem

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA





DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540



POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	5,4°C	0,0 mm/h	4,3 m/s	228°	80%
12:00	 Polojasno	8,7°C	0,0 mm/h	5,8 m/s	230°	69%
18:00	 Zamračeno	8,5°C	0,0 mm/h	4,4 m/s	200°	62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8


MECHANIZMY:


NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové Komatsu 138	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540			
- prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení - provedeno nad rámec PD			

Podpisy:









cesty jsou pro nás cílem

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA





DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540



POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	4,6°C	0,0 mm/h	1,1 m/s	290°	89%
12:00	 Zamračeno	6,7°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	316°	77%
18:00	 Polojasno	6,3°C	0,0 mm/h	1,7 m/s	119°	82%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

MECHANIZMY:


NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové Komatsu 138	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540 - prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení - provedeno nad rámec PD			

Podpisy:









cesty jsou pro nás cílem

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540



POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	2,6°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	7°	94%
12:00	 Zamračeno	5,2°C	0,0 mm/h	1,2 m/s	79°	84%
18:00	 Polojasno	8,4°C	0,0 mm/h	1,6 m/s	101°	83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o.							
	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8


MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové Komatsu 138	BIGGEST s.r.o.		1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540 - prováděny sondy pro zjištění skutečného uložení - provedeno nad rámec PD			


DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR  (Stavbyvedoucí - manažer projektu)

NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Stávající vodovod nalezen. Provedeny sondy v místě křížení s trasou SO 101 a SO 107. Skutečný stav uložení vodovodu geodeticky zaměřen a předán ke zpracování v rámci RDS.

PŘÍLOHY




 OSEK - SO 305 - OS...02-29.pdf

Podpisy:






DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI  
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

## POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Mlha	4,1°C	0,0 mm/h	1,8 m/s	6°	100%
12:00	 Zamračeno	6,2°C	0,0 mm/h	1,9 m/s	241°	94%
18:00	 Zamračeno	7,0°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	70°	91%

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
BIGGEST s.r.o. 	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8
ROADFIN STAVBY s.r.o. 	Stavbyvedoucí	1	8		Mistr Stavby	1	8

## MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA	POČ.	HOD.
Rypadlo pásové Komatsu 138	BIGGEST s.r.o.		1	8

## PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
SO305 - přeložka vodovodu v km 4,540 - zpětný zásyp provedených sond a hutnění po vrstvách - provedeno nad rámec PD			

Podpisy:





















131151105

Kompletní zobrazení

- 001 - Zemní práce

A01 - Přípravné a přidružené práce

A02 - Odkopávky a prokopávky

A03 - Hloubené vykopávky

131 - Hloubení jam

131·137·· - Hloubení nezapažených jam ručně

131·137·· - Hloubení zapažených jam ručně

131·5···· - Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
			131·5····	<b>Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně</b>			
				<b>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu</b>			
				<b>v hornině třídy těžitelnosti I</b>			
				<b>skupiny 1 a 2</b>			
<input type="checkbox"/>	001	A03	131151100	do 20 m3	m3		
<input type="checkbox"/>	001	A03	131151102	přes 20 do 50 m3	m3		
<input type="checkbox"/>	001	A03	131151103	přes 50 do 100 m3	m3		
<input type="checkbox"/>	001	A03	131151104	přes 100 do 500 m3	m3		
<input type="checkbox"/>	001	A03	131151105	přes 500 do 1 000 m3	m3		

KD\_ROADFIN\_URS 2024 01

SO 305 - Přeložka vodovodu v km 4,540 ze stavby Z\_...

174151101

Kompletní zobrazení

001 - Zemní práce

A01 - Přípravné a přidružené práce

A02 - Odkopávky a prokopávky

A03 - Hloubené vykopávky

O	Ceník	Část	Kód položky	Popis	MJ	Výrobce	Orientační cena
			174.511.01	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním			
<input type="checkbox"/>	001	A07	174151101	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		



Ragemia, s.r.o.

Plzeňská 27

266 01 Beroun

IČ: 14180235



IDDS: pwq8mry

## Vyjádření autorského dozoru

**Stavba:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

**Objekt:** SO305 Přeložka vodovodu v km 4,540

**ZL č.:** 035

**Název změny:** Sondy napojovací body vodovodu

Z důvodu nesouladu mezi dostupným zákresem vodovodu od jeho správce a skutečným uložením vodovodu byla nutná sondáž pro jeho nalezení. Nejedná se o změnu technického řešení stavby.

AD souhlasí s navrženou změnou.



S pozdravem



Ragemia, s.r.o.

## STANOVISKO TDS K ZL č. 035

**Název stavby:** Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 035

Název ZL: SO 305 Sondy vodovod

### Důvod změny:

Na základě dostupných podkladů z PDPS, byla pro potřeby přeložky vodovodu geodeticky vytyčena poloha napojovacích bodů. Stávající vodovod nebyl v napojovacích bodech a ani v jejich blízkém okolí nalezen. Bylo provedeno místní šetření se správcem vodovodu, ze kterého vyplynulo, že dostupný zakres vodovodu v dokladové části PDPS neodpovídá skutečnosti a není možnost ho vytyčit. Na základě této skutečnosti byla prováděna hloubková sondáž pro zjištění skutečného uložení vodovodu, která trvala po dobu 12 dnů, než byl vodovod nalezen. Po geodetickém zaměření byly jámy zasypany a zhutněny.

**Stanovisko TDS:** TDS souhlasí se změnou.

### Technické posouzení:

Vzhledem k zakresu vodovodu v PDPS, který neodpovídal skutečnosti, bylo nutné zjistit skutečnou polohu napojovacích bodů vodovodu.

### Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky dle ÚRS.

Odpočítané položky: - 0,00 Kč

Připočítané položky: 295 650,00 Kč

**Celkem ZL: 295 650,00 Kč**

**Závěr:** Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:

