ID	Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení
1		**Rekonstrukce depozitáře SVK PK**	**12.02. 20**	**24.02. 21**
2		Podpis SoD	12.02. 20	12.02. 20
3		Předání staveniště	27.02. 20	27.02. 20
4		Příprava zařízení staveniště	02.03. 20	06.03. 20
5		Bourací práce, zemní práce	09.03. 20	10.04. 20
6		Speciální zakládání	13.04. 20	08.05. 20
7		Železebetonové konstrukce	11.05. 20	16.10. 20
8		Střešní plášť	19.10. 20	13.11. 20
9		Výplně otvorů - fasádní	19.10. 20	27.11. 20
10		Opláštění	26.10. 20	18.12. 20
11		Zděné konstrukce	12.10. 20	06.11. 20
12		Hrubé rozvody TZB, elektro	21.09. 20	30.10. 20
13		Podlahové konstrukce	02.11. 20	27.11. 20
14		Vnitřní dispozice	21.09. 20	30.10. 20
15		Úpravy povrchů	05.10. 20	06.11. 20
16		Dokončovací práce	12.10. 20	12.02. 21
17		Výtah	09.11. 20	29.01. 21
18		Kompletace TZB, elektro	19.10. 20	05.02. 21
19		Kompletační práce	19.10. 20	05.02. 21
20		Inženýrské sítě	11.05. 20	04.12. 20
21		Komunikace a zpevněné plochy	26.10. 20	12.02. 21
22		Oplocení	18.01. 21	12.02. 21
23		Úklid,finální kompletace	08.02. 21	23.02. 21
24		Milník č.1 - Zahájení výstavby	28.02. 20	28.02. 20
25		Milník č.2 - Dokončení bouracích prací, provedení vrt.pilot a zákl.desky	06.07. 20	06.07. 20
26		Milník č.3 - Dokončení hrubé stavby	16.11. 20	16.11. 20
27		Milník č.4 - Dokončení opláštění	18.01. 21	18.01. 21
28		Milník č.5 - Stavební připravenost pro montáž posuvných regálů	12.10. 20	12.10. 20
29		**Kolejnice regálů**	**13.10. 20**	**09.11. 20**
30		montáž kolejnic regálů 3NP	13.10. 20	20.10. 20
31		montáž kolejnic regálů 2NP	21.10. 20	28.10. 20
32		montáž kolejnic regálů 1NP	29.10. 20	09.11. 20
33		**Montáž regálů**	**18.11. 20**	**23.02. 21**
34		Přípravné práce	18.11. 20	26.11. 20
35		Stěhování a montáž regálů 3NP	27.11. 20	05.01. 21
36		Stěhování a montáž regálů 2NP	16.12. 20	28.01. 21
37		Stěhování a montáž regálů 1NP	22.01. 21	22.02. 21
38		Dokončovací a kompletační činnost	16.02. 21	23.02. 21
39		Milník č.6 - Dokončení a předání kompletního díla	24.02. 21	24.02. 21

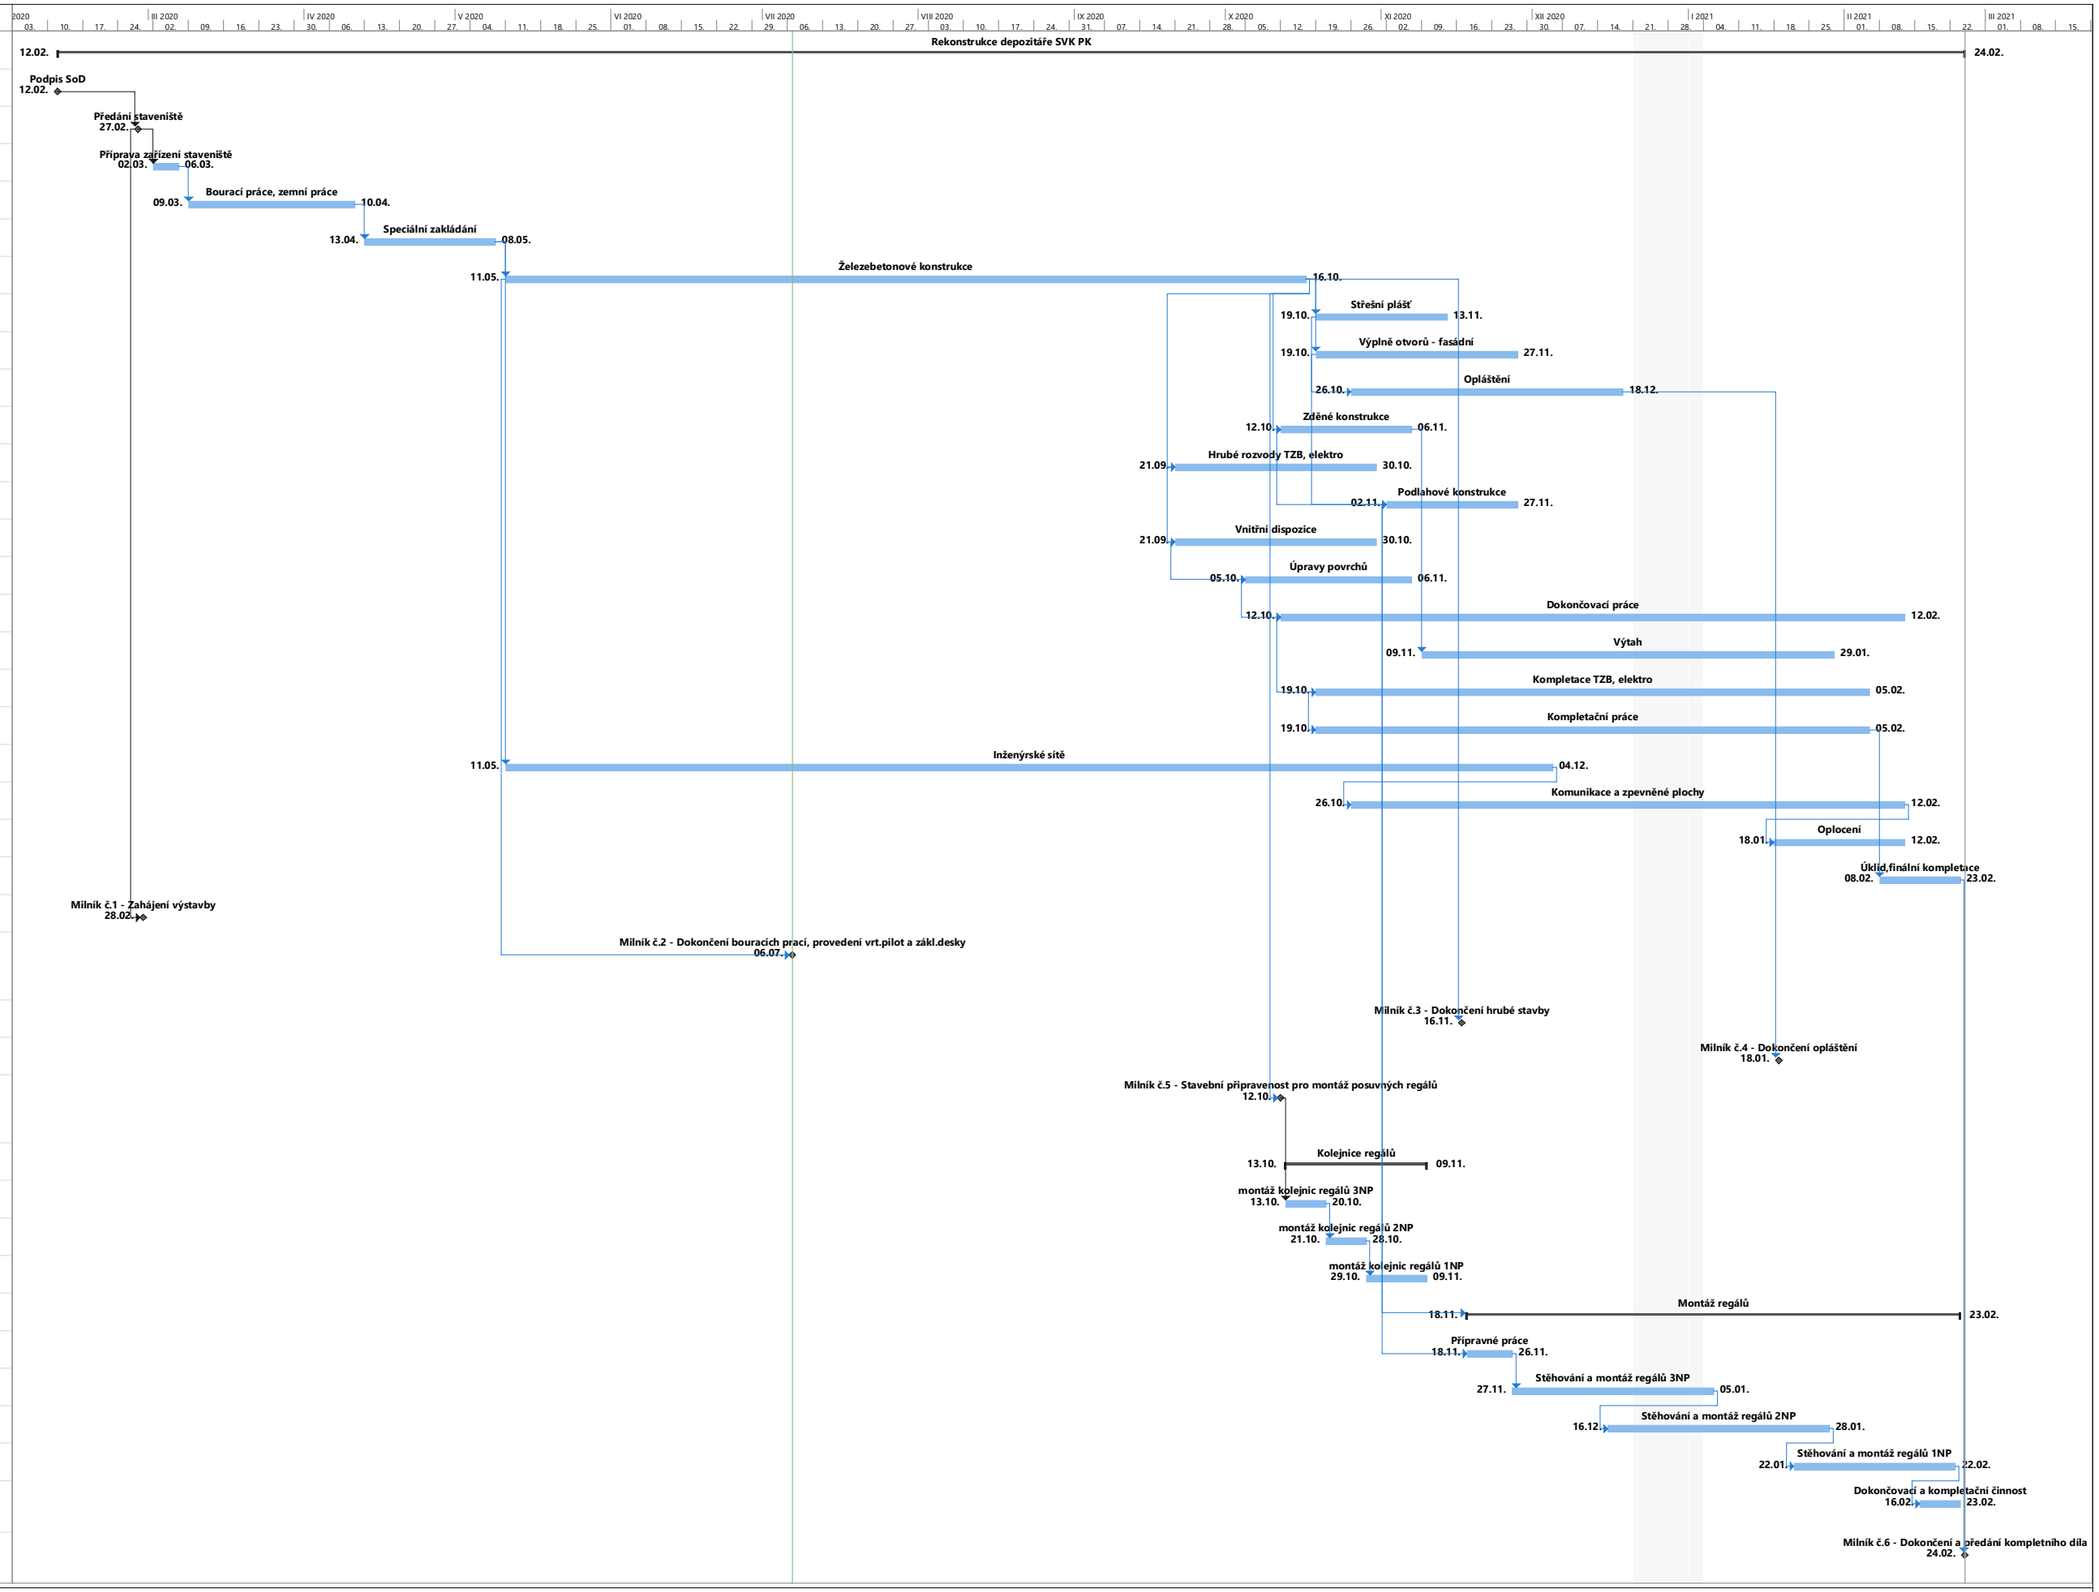

Projekt: 20 07 07_Depozitář SV
Datum: 07.07. 20

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh	
