


HORNÍ BŘÍZA - TOVÁRNÍ ULICE


SITUACE DIO 4. ETAPA M 1:250

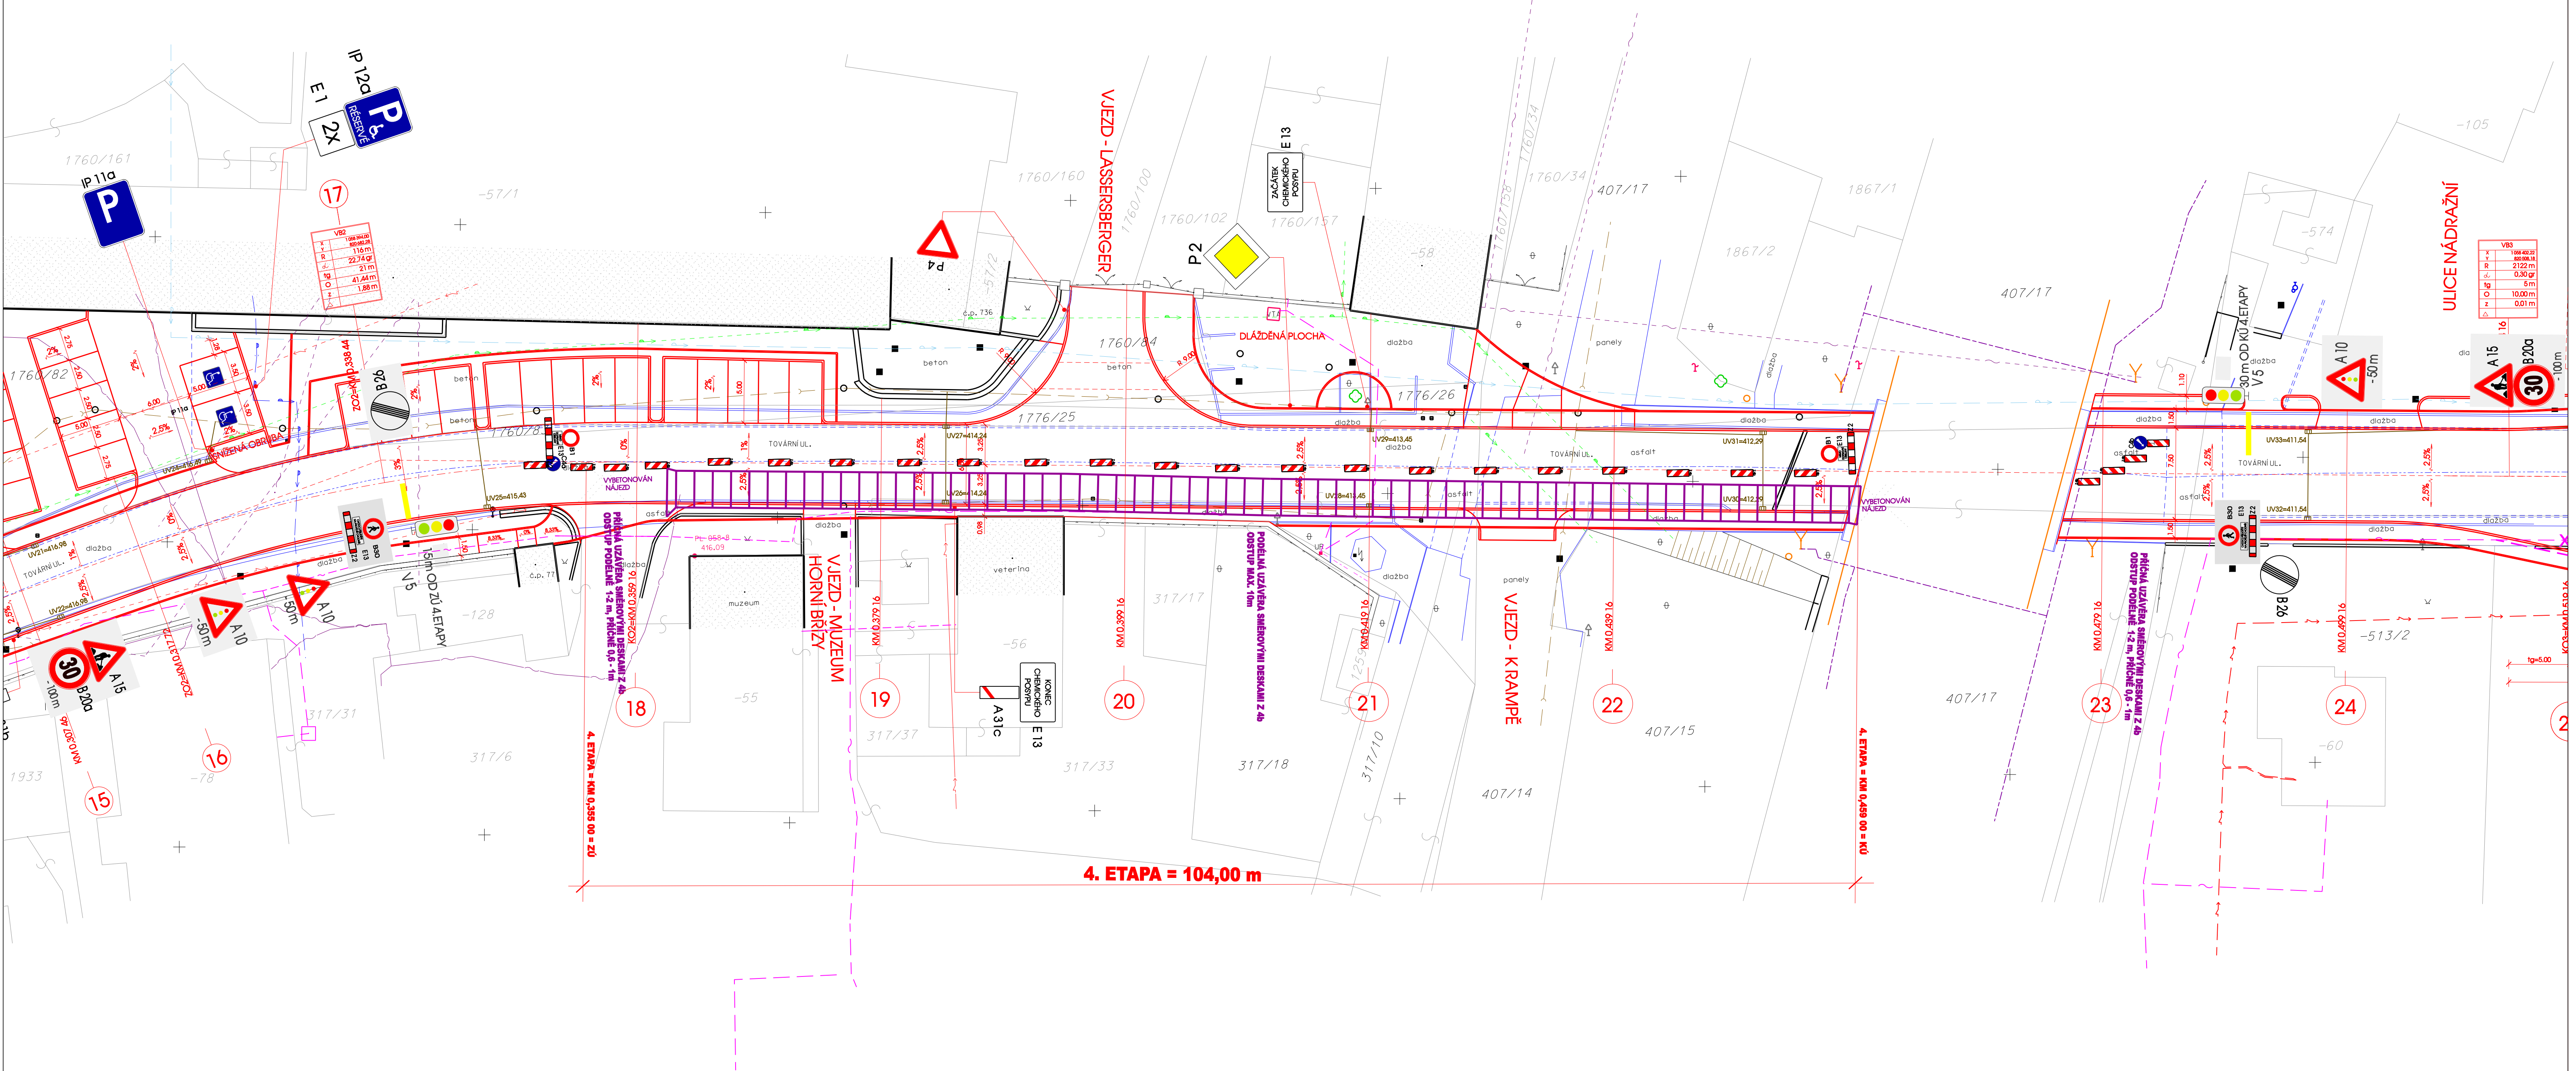


4. ETAPA = 104,00 m

4. ETAPA - 1. ČÁST VÝSTAVBY

BUDE OSAZENO PROVIZORNÍ DZ OZNAMUJÍCÍ SVĚTELNOU SIGNALIZACI A UZAVÍRKU ČÁSTI KOMUNIKACE V DÉLCE 104 m Z OBOU STRAN. PO POLOŽENÍ PROVIZORNÍ PANELOVÉ VOZOVKY Z PANELŮ 300/150/15 DO ŠTERKOVÉHO LOŽE V TL. 15 cm VPRAVO VE SMĚRU STANIČENÍ V DÉLCE 104 m BUDE PROVEDENA NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TOVÁRNÍ ULICE PO LOŽNOU VRSTVU. PAK BUDE PANELOVÁ VOZOVKA ODSTRANĚNA A DOBUDOVÁNA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST VPRAVO ZA PROVOZU PO LOŽNÉ VRSTVĚ. NÁSLEDNĚ BUDE CELÁ VOZOVKA PŘEBALENA ŽIVICÍ ZA PROVOZU DLE SCHEMA B 25.1 TP 66. II. VYDÁNÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ TĚTO PŘÍLOHY PROJEKTU.

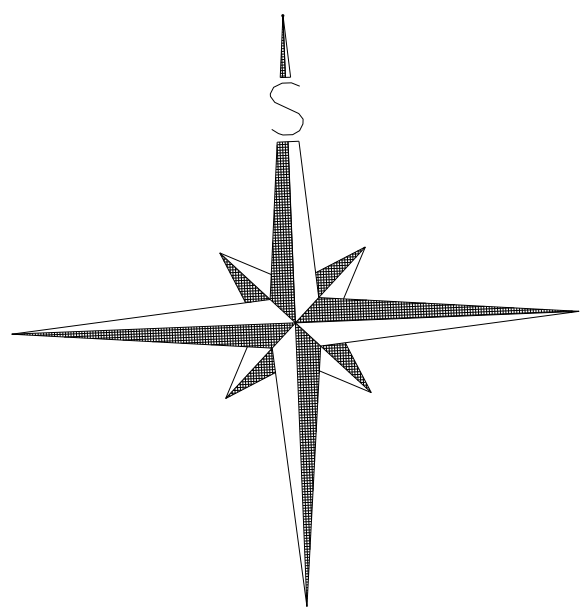

 BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby Goldschneiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, projekce@boula.cz , IČ 280 35 461				
Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj	Horní Bříza, Plzeňský
Libor Boula	Z. Sedláčková	Libor Boula	Druh dokument.	PDPS
			Číslo zakázky	0913
Investor:	SÚS Plzeňského kraje, p.o.		Datum	06/2017
	Obec Horní Bříza		Měřítko	1:250
Stavba:	HORNÍ BŘÍZA - TOVÁRNÍ ULICE - PRŮTAH		objekt	č. přílohy
Název výkresu: E2 - DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ			č. paré	
SITUACE 4. ETAPA - 1. ČÁST VÝSTAVBY			E2	5
