

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 536 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 80301252

Číslo smlouvy zhotovitele: S14-023-0018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737
sídlo: Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova 18, PSČ 306 13
jednající: Ing. Stanislav Liška, generální ředitel
IČ: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5146600001/5500
telefon: 377 172 101
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních na základě plné moci ze dne 7.10.2013, pod
č.j.:5382/13/SÚSPK-P, Ing. Jiří Velíšek – ředitel Oblastní
správy JIH

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. SWIETELSKY stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032
sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
jednající/zastoupen: Přemysl Holmík, vedoucí odštěpného závodu
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 0212269343/0300
telefon, fax: ústř. 379 410 292, 379 410 299
e-mail: office-domazlice@swietelsky.cz
datová schránka: amx5p38
Kontaktní osoba: Ing. Jan Baloun, ředitel oblasti Domažlice
Telefon: 724 136 857
Email: j.baloun@swietelsky.cz

zmocněný zástupce: Ing. Jan Baloun, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik odd. přípravy
a kalkulací na základě plné moci ze dne 1.11.2013

(dále jen „zhotovitel“)

2.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky „**Oprava rámového propustku III/18515 Tajanov - Tupadly**“ spočívající v:

Oprava propustku na sil. III/18515 mezi obcemi Tajanov a Tupadly.

2.2. Podrobná specifikace díla:

- Řeší se kompletní opravu včetně rozšíření rámového propustku

Dílo bude provedeno dle přiloženého výkazu výměr a PD

2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních či jiných prací, dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.4. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a pokynů ze strany objednatele a zcela v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení, která je přílohou č. 2 této smlouvy.

2.5. Podklady pro provedení díla jsou:

- zadávací dokumentace
- položkový rozpočet nazvaný oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací jako součást nabídky zhotovitele
- Projektová dokumentace – projektant: Zítek – IP projekt s.r.o, Částkova 55, 326 00 Plzeň

2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškerou dokumentaci k provedení díla a že se s ní podrobně seznámil a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené dokumentaci nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.

2.7. Místem plnění předmětu díla je silnice III/18515-oprava propustku mezi obcemi Tajanov-Tupadly na území okresu Klatovy.

2.8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či nesmí dojít ke změně díla. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

2.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

- 2.10. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně subdodavatele uvedené v seznamu subdodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předkládat ke schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu subdodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací na celku díla.
- 2.11. V případě požadavku zhotovitele na změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí zhotovitel doložit ke své žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokázal původní subdodavatel, jinak takové žádosti objednavatel nevyhoví.

3. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za smlouvou smlouvené řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle nabídky zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	616 980,57 Kč
DPH	129 565,93 Kč
CELKEM	746 546,50 Kč

Dále jen „cena díla“

- 3.2. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná, přičemž závazným pokladem pro její stanovení je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“). Podrobný položkový rozpočet je nazýván v zadávací dokumentaci rovněž jako oceněný výkaz výměr nebo oceněný soupis prací.
- 3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem v této smlouvě, je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet, resp. oceněný výkaz výměr zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“), jehož správnost a úplnost zhotovitel zaručuje. Tento rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny případných méněprací či víceprací na díle.
- 3.6. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla. Nejsou-li uvedeny výslovně jako samostatné položky, má se za to, že je jejich hodnota promítnuta do všech oceněných položek.
- 3.7. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- vícepráce – zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla
 - méněpráce – zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou součástí předmětu díla
 - změny zákonných sazeb DPH - v tomto případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění
- 3.8. V případě objektivně odůvodněné potřeby víceprací se stanoví cena prací dle položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele. Nebude-li konkrétní položka jeho součástí, pak z ceny takové položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
- 4.2. **Zahájení provádění díla:** do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- 4.3. **Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 30.11.2013.**
- 4.4. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

5. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. 4.1 této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na případné další účastníky stavby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 5.4. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
- 5.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel

zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- 5.6. Veškeré náklady související se stavenišťem jsou zahrnuty v ceně díla.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Pouhý zápis do stavebního deníku není v tomto případě považován za splnění shora uvedené povinnosti a neopravňuje zhotovitele k přerušení provádění prací.
- 6.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla denně. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 1 pracovní den předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen zpracovat plán BOZP, přičemž tento dokument je součástí díla a jeho cena je zahrnuta v celkové ceně díla.
- 6.6. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny technické normy, platné a účinné právní předpisy ČR ovlivňující provedení díla dle této smlouvy a závazné pro zhotovitele. Při jejich porušení nese zhotovitel odpovědnost za škodu.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 6.10. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu příslušných předpisů o odpadech v platném znění.
- 6.11. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu pro zajištění kvality a bezvadnosti díla a dále nad bezpečností práce a požární ochrany na staveništi.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli do 1 týdne po předání díla seznamy subdodavatelů dle ust. § 147a odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 6.13. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratorii určenou objednatel.
- 6.14. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat nejméně 1 x za 14 dní následujícím způsobem. Kontrolní den svolá TDS (technický dozor stavebníka) a zajistí písemný zápis ohledně projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémech, požadavcích zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Kontrolní dny budou probíhat za účasti TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP, stavbyvedoucího zhotovitele, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve TDS..

7. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání. Objednatel se stává vlastníkem díla provedením stavby.
- 7.2. Vlastnictví stavebního a montážního zařízení používaného zhotovitelem ve spojitosti s dílem zůstává ve vlastnictví zhotovitele.
- 7.3. Materiály převyšující potřeby díla zůstávají vlastnictvím zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
- 7.4. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými subdodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad

díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na díle včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně v ceně díla dle této smlouvy. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.
- 7.9. Originál pojistné smlouvy dle čl. 7.8. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli do 1 dne ode dne uzavření této smlouvy. Dále je zhotovitel k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost již předložené pojistné smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal.

8.

STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.
- 8.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.3. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 8.4. Stavební deník bude zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.

9.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 2 kalendářní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 526/2006 Sb., v platném znění a dále doklady o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
- 9.3. Dílo je považováno za dokončené podpisem protokolu o předání a převzetí ze strany objednatele a zhotovitele za předpokladu řádného dokončení díla a splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 9.4. Dohoda o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. Přebírání díla na části je vyloučeno.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených zadávací dokumentací, případně projektovou

dokumentací. Tam, kde nejsou parametry stanoveny objednatelem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

- 9.6. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. 4.4 této smlouvy.
- 9.7. Objednatel má právo, nikoliv povinnost, převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převzme-li dílo s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, tzv. předávacím protokolu.
- 9.8. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

10.

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, uvedeného v protokolu o předání a převzetí předmětu díla dle čl. 9.3 této smlouvy, případně až od data odstranění poslední z vad či nedodělků stanovených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9.7. této smlouvy, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, který provedl reklamaci, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž je tak povinen učinit nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 10.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1 této smlouvy za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 10.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucím vlastníkům díla.

- 11.1. Vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. 9.3 této smlouvy
- 11.2. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury řádně vystavené zhotovitelem do 10 dnů po předání a převzetí díla dle čl. 9.3 této smlouvy a doručené na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 11.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která nebude splňovat tyto náležitosti je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit bez toho, že by se dostal do prodlení s její úhradou. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby
 - b) číslo stavby, číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu
 - d) vlastnoruční podpis oprávněných zástupců objednatelů stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací
 - e) rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu- nestačí odkaz na číslo smlouvy
 - f) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH)
 - g) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.4. Splatnost faktury dle čl. 11.2. této smlouvy mající náležitosti dle čl. 11.3. této smlouvy se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle pro každého objednatele zvlášť, vzájemně odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele.
- 11.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné subdodavatele.
- 11.6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

- 11.8. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativně.
- 12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností dle článků 2.8. až 2.12, 7.8., 7.9. této smlouvy, a to i opakovaně, v případě trvání porušení povinností pak dále za každý den tohoto trvání v téže výši.
- 12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůt, sjednaných v čl. 4.1., 4.2., 4.3. nebo 4.4. této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním lhůty pro dokončení a předání díla sjednané v čl. 4.3. této smlouvy
- 12.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: 9.2., 11.6.
- Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 12.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady či nedodělku uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. 9.7 této smlouvy.
- 12.7. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 3 pracovních dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1. této smlouvy, splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.

- 12.8. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.9. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednatelům vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.
- 12.10. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody.

13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, poruší-li jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou podstatným způsobem nebo poruší-li jakékoliv své povinnosti či závazky ze smlouvy opakovaně, tj. více než jednou. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí zhotovitel pokračovat v plnění předmětu smlouvy vyjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku objednatele. V takovém případě musí zhotovitel pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit dílo takovým způsobem, aby bylo odstraněno nebezpečí shora uvedené újmy či škody.
- 14.2. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
- 14.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:
- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 3 pracovní dny
 - zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 - zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. 4.3. této smlouvy
 - zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používaných komunikacích a chodnících
 - zhotovitel nepředloží originál pojistné smlouvy nebo certifikát k prokázání její platnosti a účinnosti
 - zhotovitel pověří provedením díla subdodavatelem ve větším rozsahu než sjednaném v této smlouvě

- zhotovitel pověří provedením díla jiného subdodavatele než uvedeného v seznamu subdodavatelů odsouhlaseném objednatelem ve znění jeho změn
 - zhotovitel k výzvě objednatele nepředloží doklady o provedení a výsledku měření či zkoušek splnění kvality díla
 - zhotovitel provede zakrytí části díla bez kontroly ze strany objednatele nebo neprovede písemnou výzvu před zakrytím části díla
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele
 - zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce na díle neodborně nebo v rozporu se smlouvou
- 14.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou splatné faktury delší než 30 dnů.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na náhradu škody a smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 14.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně vynaložených a nutných nákladů. Ve smyslu ust. § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, se dohodou smluvních stran omezuje nárok na náhradu škody na straně zhotovitele, a to na maximální výši 5% z ceny díla bez DPH. Zhotovitel se nároku na náhradu škody nezpůsobené úmyslně, ve výši přesahující shora uvedený limit, výslovně vzdává, přičemž smluvní strany se dohodly, že takovýto nárok nebude zhotovitelem vůči objednateli uplatněn.

15. ROZHODČÍ SOUD

- 15.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sudiště Plzeň, podle jeho řádu třemi rozhodci.

16. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

17. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

- 17.1. Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na níže uvedené korespondenční adresy a současně do jejich datových schránek:

Objednatel Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace: Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Zhotovitel: adresa uvedená v záhlaví smlouvy

- 17.2. Nepodaří-li se doručit písemnost poštou, smluvní strany výslovně sjednávají, že účinky doručení nastávají třetím dnem po odeslání datové zprávy do datové schránky účastníka a současně třetím dnem po odeslání doporučeného dopisu na adresu uvedenou shora, a to i v případě, že adresát zásilku odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických a finančních a dále seznam dalších osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP a osoby odpovědné za technický dozor objednatele (TDI), je-li to obvyklé s ohledem na předmět plnění a charakter díla. Tento seznam musí průběžně aktualizovat.
- 18.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je návrh smlouvy doplněný o přesně vyznačené chybějící údaje, řádně podepsaný osobou oprávněnou jednat za zhotovitele, podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele.
- 18.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.
- 18.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou.
- 18.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z rozpočtu Plzeňského kraje či rozpočtu SÚS PK, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

19.


SEZNAM PŘÍLOH

19.1. Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- nabídka zhotovitele a položkový rozpočet jako její součást
- zadávací dokumentace včetně technické dokumentace stavby

V Klatovech dne 1.11.2013

objednatel:



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
ředitel Oblastní správy JIH na základě plné
moci ze dne 7.10.2013

V Domažlicích dne 1.11.2013

zhotovitel:



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Ing. Jan Baloun
ředitel oblasti Domažlice



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Jana Šlaufová
technik odd. přípravy a kalkulací

Za správnost odpovídá: Pavel Franěk

podpis.....

Rekapitulace členění soupisu prací

Stavba: Oprava rámového propustku III/18515 tajanov - Tupadly
Objekt: propustek

	Cena celkem
Náklady soupisu celkem	616 980,57
HSV - Práce a dodávky HSV	594 097,35
1- Zemní práce	84 644,96
2- Zakládání	38 130,72
3- Svislé a kompletní konstrukce	155 325,02
4- Vodorovné konstrukce	7 683,53
5- Komunikace	125 116,69
9- Ostatní konstrukce a práce -bourání	178 252,88
99- Přesun hmot	4 943,55
PSV- Práce a dodávky PSV	22 883,22
711- Izolace proti vodě ,vlhkosti a plynům	19 040,73
783- Dokončovací práce- nátěry	3 842,49

Rozpočet

Stavba: Oprava rámového propustku III/18515 Tajanov - Tupadly

Objekt: Propustek

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 594 097,35 72,701

1 Zemní práce 84 644,96 23,053

1	113154123	Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š. 1 m pl. Do 500 m2 bez překážek v trase (188+64)	m2	252,000	132,39	33 362,28	0,013
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	140,000	35,71	4 999,40	0,000
3	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3- odstranění zemní hrázky	m3	14,000	59,92	838,88	0,000
4	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (0,5*(10,85*9,1+2,21*8,5))	m3	58,760	134,30	7 891,47	0,000
5	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	58,760	188,03	11 048,64	0,000
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	104,040	99,83	10 386,31	0,000
7	171103101	Zemní hrázky z horniny tř. 1 až 4 - zřízení	m3	14,000	119,84	1 677,76	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (104,04*1,8)	t	187,272	26,36	4 936,49	0,000
9	172103102	Zřízení těsnícího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C - jilová tl. 100mm vč. dodávky jilu 7,5*0,1*(1,4+2)	m3	2,550	162,61	414,66	0,000
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 1,07*9,1+0,44*8,5+1,07*9,1+0,36*8,5	m3	26,274	76,01	1 997,09	0,000
11	583441970	stěrkodrtí frakce 0-63 (zásyp stáv. materiálem 13,5 m3) 12,8*1,8	t	23,040	191,74	4 417,69	23,040
12	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 (25+72)	m2	97,000	27,57	2 674,29	0,000

2 Zakládání 38 130,72 1,988

13	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,200	912,13	1 094,56	1,956
14	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	16,000	32,93	526,88	0,008
15	272311123	Zásyp mezi stáv. A novým propustkem z betonu prostého C 8/10 1,04*7,7	m3	8,008	1 301,30	10 420,81	0,000
16	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15 3,5*0,1*9,4+0,1*(1,8*3+1,5*2,3+1,5*1,6)	m3	4,415	2 711,50	11 971,27	0,000
17	274311124	Základové pasy, z betonu prostého C12/15 - pod drenáže 0,27*8+0,19*8	m3	3,680	2 711,50	9 978,32	0,000
18	274354111	Bednění základových pasů- zřízení	m2	16,000	231,72	3 707,52	0,023
19	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	16,000	26,96	431,36	0,001

3 Svislé a kompletní konstrukce 155 325,02 40,177

20	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 (10,4+8)*0,22	m3	4,048	3 376,06	13 666,29	0,000
21	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení (10,4+8)*0,8*0,3+4*0,8*0,3	m2	5,376	1 094,63	5 884,73	0,224
22	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	5,376	80,34	431,91	0,000
23	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,627	33 785,34	21 183,41	0,658
24	334323218	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37 (3,4+2,5)*0,5*0,55+2,6*0,54+((1,85+1,11)*0,5+(2,4+1,88)*0,5)*0,45+(1,76+1,95)*0,37	m3	6,028	4 044,55	24 380,55	0,000
25	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení (1,65+3,4+2,5+1,85+1,35+1,1+2,4+1,35+1,9+0,35)*0,3+(0,35+2,5+2,6)*1,6+(1,85+0,35+1,76+2,4+0,35+1,9+0,35)*1,1	m2	23,931	826,88	19 788,07	0,032
26	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	23,931	33,55	802,89	0,001
27	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,342	33 785,35	45 339,94	1,444
28	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	9,000	1 291,85	11 626,65	1,296
29	593834522	propustí rámové Beneš 2,0/1,5 - pouze doprava ze skladu SÚSPK	kus	9,000	829,16	7 462,44	36,522
30	389381119	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové páry dílců z betonu C 30/37	m3	1,200	3 965,13	4 758,16	0,000

4 Vodorovné konstrukce 7 683,53 0,000

31	457311114	Vyovňovací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu 6,1*9*0,05	m3	2,745	2 799,10	7 683,53	0,000
----	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

5 Komunikace 125 116,69 6,102

32	564861111	Podklad ze stěrkodrté ŠD tl. 200 mm 7,5*(3+2,1)	m2	38,250	123,43	4 721,20	0,000
33	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm 6,6*(3,3+2,4)	m2	37,620	162,62	6 117,76	0,000
34	565166121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl. 80 mm š přes 3 m	m2	47,000	484,05	22 750,35	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
35	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	32,500	70,17	2 280,53	6,102
36	577145121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl. 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	235,000	282,72	66 439,20	0,000
37	578142215	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 6,1*6	m2	36,600	623,16	22 807,66	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 178 252,88 1,381

38	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků do 2 m	kus	4,000	17 417,84	69 671,36	0,158
39	911334111	Svodidlo ocelové zábradlní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy bez výplně	m	18,400	5 253,80	96 669,92	0,938
40	938111111	Čištění zdiva opěr, piliřů, křídel odstranění stáv. izolace 8,75*(0,65+2,75)	m2	29,750	66,94	1 991,47	0,000
41	962051111	Bourání zdiva a říms z ŽB 0,4*4*0,35+0,4*4*0,55+1*0,3*1,5+1*0,3*1,5	m3	2,340	2 236,96	5 234,49	0,285
42	966005211	Rozebrání a odstarmění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	8,000	242,67	1 941,36	0,000
43	404439990	Dočasná dopravní značení - komplet	kus	1,000	2 744,29	2 744,29	0,000

99 Přesun hmot 4 943,55 0,000

44	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	5,816	168,12	977,79	0,000
45	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 5,816*9	t	52,344	8,81	461,15	0,000
46	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - frézovaná živichná drt	t	32,256	29,36	947,04	0,000
47	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 32,256*9	t	290,304	8,81	2 557,58	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 22 883,22 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 040,73 0,000

48	711122	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTÍ TLAK VODE ASFALT PÁSY NA PLOŠE SVISLÉ	m2	17,000	255,61	4 345,37	0,000
49	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ AFALTOVÝMI PÁSY	m2	55,000	245,62	13 509,10	0,000
50	711509	OCHRANA IZOLACE - IZOCHRAN	m2	17,000	69,78	1 186,26	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 3 842,49 0,000

51	783893000	OCHRANNÝ NÁTER RIMS ZB (POLYURETANOVÁ ŠTERKA) (0,3+0,75+0,27)*18,4+0,8*0,3*4	m2	25,248	152,19	3 842,49	0,000
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

Celkem 616 980,57 72,787



LEGENDA:

	VOZOVKA – žulová
	KRAJNICE – nepevněná
	NÁSTP – travník
	TRÁVNÍK
	DLAŽBA LOMOVÝ KÁMEN
	OPRAVA KORYTA POTOKA – DNO
	OPRAVA KORYTA POTOKA – SVAHY

STROM – stávající
STROM – stávající uťený ke kácení
STROM – nově
ACC javor babyka – Acer compostre – 2 ks




stávající podzemní inž. síť:

telefonní kabel

Výškový systém: BALI p.v.
Soutokový systém: JISK

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTVOŘIT PODZEMNÍ INŽ. SÍŤ !!

		Zitek-IPROJEKT s.r.o.	
Ing. Václav		Čestkova 55	
Ing. Zdeněk		326 00 Písek	
Ing. Zdeněk		tel./fax: 377 377 855	
WU		Formát	
Obrazovka		3 A4	
Akce		Datum	
Situace		10/2012	
Situace		Účel	
Situace		DSP	
Situace		Číslo zakázky	
Situace		D1-13	
Situace		Měřítko	
Situace		1:250	
Situace		Číslo výkresu	
Situace		C.1	

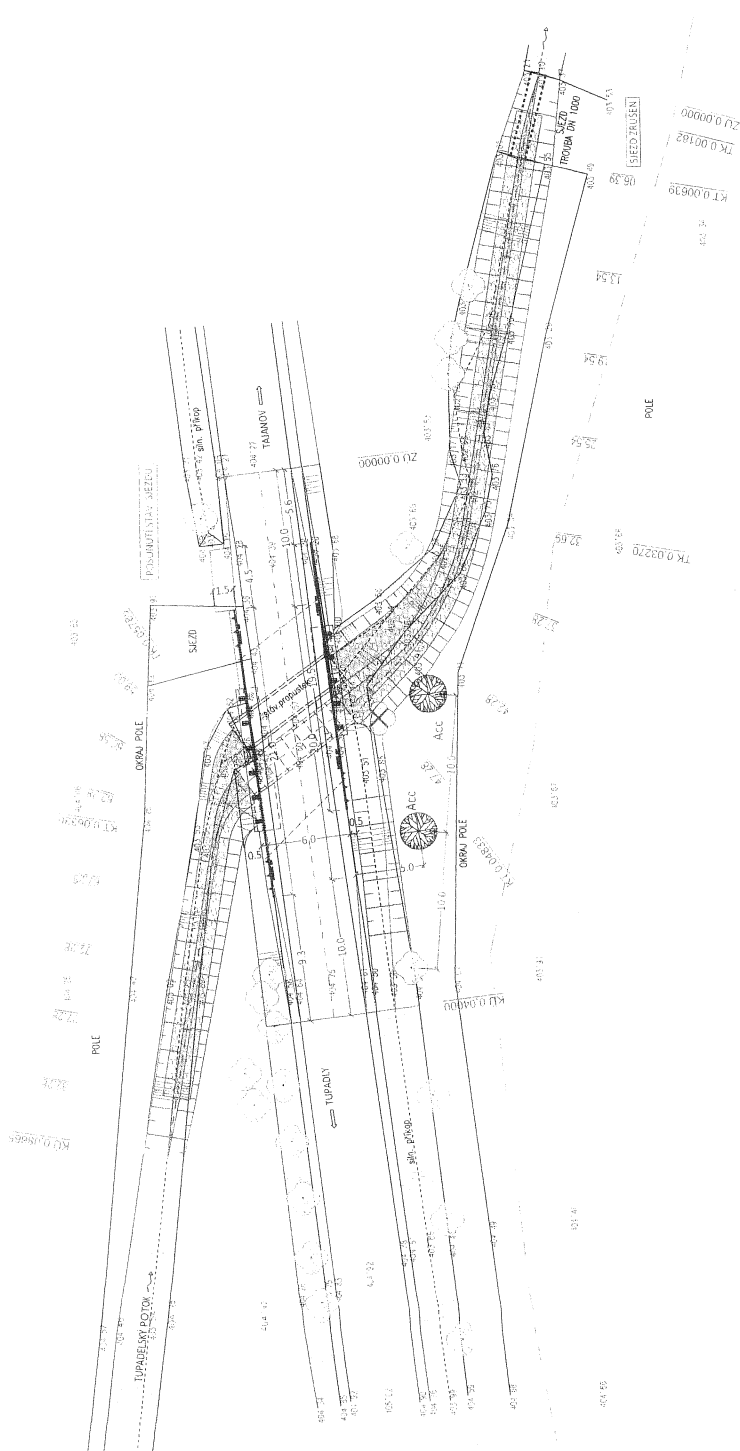



Plná moc

Společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**,
se sídlem Plzeň, Železničářská 1234/79, PSČ 312 00
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: panem **Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu**
r.č. 720525/2076, bytem Jižní 288, 330 02 Dýšina

uděluje tímto

panu **Ing. Janu Balounovi** – r.č. 530305/0189, bytem Nová 342, 341 92 Kašperské Hory

a

paní **Janě Šlaufové** – r.č. 726122/2166, bytem Mathauserova 70, 345 61 Staňkov

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, podávání žádostí o uzavírky dle správního řádu apod.), a to do výše bez platné DPH:


5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí výše uvedení zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky a účasti při otevírání obálek.


Tato plná moc je platná do 31.3.2014
V Plzni dne 1.11.2013

Zmocnitel:


Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímám:
Zmocněnec:


Jana Šlaufová


Ing. Jan Baloun

